

**1880 B E X**

Rte de la Griabannaz 9
024 463 03 10
E-mail : entreprise@echenard.ch

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Av. des Baumes 4
021 944 54 08

1870 MONTHEY

Les llettes
024 471 71 17


GENIE CIVIL

Route 109 : Monthey – Choëx – Les Giettes Tronçon : Prafenne – Carrefour RC 107

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Maître d'ouvrage | Canton du Valais
Service de la Mobilité Martigny
Stéphane Drost (027 607 11 00) |
| 2. Année d'exécution | 2019 |
| 3. Durée des travaux | 2 mois |
| 4. Montant des travaux | 430'000.00 |
| 5. Ingénieurs | Canton du Valais (DMTE)
M. Liand Jean-Luc (027 607 11 00) |



- | | |
|--------------------------------|--|
| 7. Descriptif du projet | <ul style="list-style-type: none"> - Assainissement du réseau de collecte des eaux de surface - Assainissement d'ouvrage de soutènement en béton armé - Fraisage du revêtement bitumineux existant ép. 20 mm pour adhérence au support - Travaux de renforcement et d'assainissement de la superstructure existante - Préparation et pose d'un enrobé bitumineux type ACB 16 N pour reprofilage de l'entier de la chaussée - Préparation et pose d'un enrobé bitumineux type AC 11 N pour couche d'usure - Travaux de raccordements des accès privés et finitions bords de chaussée |
| 8. Partenaires | <ul style="list-style-type: none"> - Reproad : fraisage du revêtement - Lessus HB : balayage et lavage haute pression des supports - Bitex Bimoid AG : encollage des supports |
| 9. Méthode d'exécution | <ul style="list-style-type: none"> - Travaux réalisés sur une route de montagne principale avec un important trafic pondéral ainsi que deux lignes de bus régulières (TPC et Car Postal) - Travaux de génie civil et préparatoires réalisés avec route ouverte au trafic - Travaux de pose des enrobés bitumineux réalisés sur route fermée au trafic avec mise en place d'une déviation - Pose des enrobés bitumineux en toute largeur afin d'éviter un joint central « à froid » |

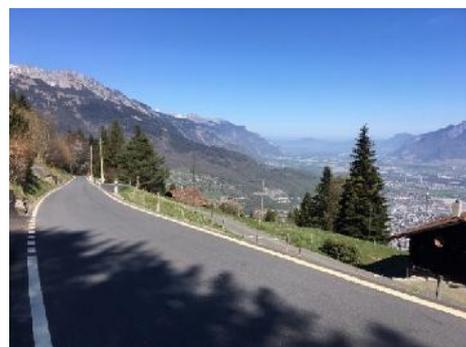

**1880 B E X**

Rte de la Griabannaz 9
024 463 03 10
E-mail : entreprise@echenard.ch

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Av. des Baumes 4
021 944 54 08

1870 MONTHEY

Les Illettes
024 471 71 17

GENIE CIVIL / REVÊTEMENT BITUMINEUX

RC 435 Lourtier-Fionnay tronçon : La Barmasse

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Maître d'ouvrage | Canton du Valais / Service de la Mobilité
Frédéric Moulin (027 607 11 00) |
| 2. Année d'exécution | 2018 |
| 3. Durée des travaux | 2 mois |
| 4. Montant des travaux | 450'000.00 |
| 5. Ingénieurs | Canton du Valais (DMTE)
M. J.-J. Sarrasin (027 607 11 00) |
| 7. Descriptif du projet | <ul style="list-style-type: none"> - Fraisage complet du revêtement bitumineux existant épaisseur jusqu'à 10 cm - Concassage in-situ des matériaux fraisés directement en suivant la raboteuse - Réglage de la planie avec matériaux d'apports pour correction des dévers et du profil en long - Pose d'un enrobé bitumineux type AC 16 N (B70/100) en monocouche d'une épaisseur de 7 cm - Réfection des joints et de l'étanchéité du tablier de deux ponceaux sur torrents - Assainissement des parements en moellons de trois ouvrages de soutènement - Réfection complète des couronnements en béton armé de trois ouvrages de soutènement |
| 8. Partenaires | <ul style="list-style-type: none"> - Reproad SA : fraisage - P. Delarzes SA : concassage matériaux fraisés - SERC Sàrl : joints et étanchéité - Von Ro Cerdeira SA : échafaudages |
| 9. Méthode d'exécution | <ul style="list-style-type: none"> - Travaux réalisés sur une route de montagne principale avec un important trafic touristique, une ligne de bus régulière (Car Postal) ainsi que l'exploitation du barrage de Mauvoisin (FMM SA) - Travaux préparatoires et de génie civil exécutés sur route ouverte au trafic - Travaux de fraisage, concassage, réglage planie et pose de l'enrobé bitumineux exécutés sur route fermée au trafic avec mise en place d'une déviation - Pose délicate de l'enrobé bitumineux dans le sens descendant afin de permettre le ravitaillement des matériaux, la route de déviation ne permettant pas un accès aux poids lourds - Pose de l'enrobé bitumineux en toute largeur afin d'éviter un joint central «à froid» |



**1880 B E X**

Rte de la Griabannaz 9
024 463 03 10
E-mail : entreprise@echenard.ch

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Av. des Baumes 4
021 944 54 08

1870 MONTHEY

Les llettes
024 471 71 17

GENIE CIVIL

COMMUNE DE MARTIGNY ET TMR SA
AVENUE DES NEUVILLES
REFECTION DE CHAUSSEE ET ASSAINISSEMENT
DU PASSAGE A NIVEAU

- 1. Maître d'ouvrage**
 - Ville de Martigny (M. Gay) 027 721 25 50
 - TMR SA Martigny (M. Pellouchoud) 079 223 23 86
- 2. Année d'exécution** 2018
- 3. Durée des travaux** 2,5 semaines
- 4. Montant des travaux** 150'0000.00
- 5. Ingénieurs**
 - Alpatec SA (M. Formaz) 027 722 67 67
 - TMR SA (M. Vaudan) 078 628 07 39
- 6. Descriptif du projet**
 - Fraisage du revêtement bitumineux et réfection du coffre de la chaussée
 - Réfection des bordures béton et des sacs dépotoirs
 - Réglage planie de la chaussée et pose de la couche de support
 - Assainissement du passage à niveau TMR SA
 - Préparation et pose de la couche d'usure
- 7. Partenaires**
 - Reproad SA : Travaux de fraisage du revêtement
 - TMR SA : Travaux ferroviaires
- 8. Méthode d'exécution**
 - Travaux réalisés sur un axe principal avec une très forte charge de trafic pondéral
 - Travaux réalisés sans interruption du trafic et régulé au moyen de feux de circulation hormis pour la pose de la couche d'usure qui s'est déroulée sur route fermée au trafic moyennant la mise en place d'une déviation importante sur la H21 (OFROU) et en ville de Martigny, ceci afin de poser le revêtement final en toute largeur et ainsi d'éviter un joint central « à froid »
 - Travaux d'assainissement du passage à niveau réalisés de nuit et en collaboration avec le service infrastructure des TMR SA



**1880 B E X**

Rte de la Gribannaz 9
024 463 03 10
E-mail : entreprise@echenard.ch

1814 LA TOUR DE PEILZ

Av. des Baumes 4
021 944 54 08

1870 MONTHEY 1

Les llettes
Case postale 324
024 471 71 17

REVÊTEMENT BITUMINEUX RC 705 AIGLE - VY-NEUVE



- 1. Maître d'ouvrage** Canton de Vaud - Lausanne/ OFROU - Estavayer-le-Lac
M. Gilbert Mader 021/316.70.40 / M. David Gastaldi 058/461.87.11
- 2. Année d'exécution** 2017
- 3. Durée des travaux** 1 semaine
- 4. Montant des travaux** 121'000.00
- 5. Ingénieurs** Service des Routes - division entretien - Rennaz
M. Steve Molliet 021/557.85.40
- 6. Descriptif du projet** Réfection du revêtement routier de la route cantonale Aigle - Le Sépey, sur une longueur de 450 m' avec trafic journalier important
- 7. Partenaires**
 - Framix : travaux de fraisage
 - Prodo : encollage
- 8. Méthode d'exécution**
 - Cet axe de transit important nous a obligés à exécuter ces travaux en 2 étapes avec maintien du trafic
 - Réfection de la couche d'usure : AC 11 S PMB ~300 To



**1880 B E X**

Rte de la Gribannaz 9
024 463 03 10
E-mail : entreprise@echenard.ch

1814 LA TOUR DE PEILZ

Av. des Baumes 4
021 944 54 08

1870 MONTHHEY 1

Les Ilettes
Case postale 324
024 471 71 17

GENIE CIVIL

REVÊTEMENT BITUMINEUX

LOT 17105 TRONÇON LE GUERCET - LA POINTE
RTE 90 MARTIGNY-BOURG - T9 LA POINTE



1. Maître d'ouvrage Etat du Valais, SRTCE Martigny
M. Huguet Bertrand

2. Année d'exécution 2017

3. Durée des travaux - Génie civil : 4 jours
- Revêtement bitumineux : 2 jours

4. Montant des travaux CHF 110'000.00

5. Ingénieurs SRTCE Martigny
M. Huguet Bertrand

6. Descriptif du projet - Fraisage complet de la surface jusqu'au niveau de la superstructure
- Réglage de la planie prête à recevoir un revêtement bitumineux y compris correction des dévers et du profil en long de la chaussée
- Pose d'un enrobé bitumineux type ACT 22 S B 70/100 couche de liaison et pose d'un enrobé bitumineux type AC 11 S PMB 65/105-45

7. Partenaires Reproad SA : fraisage des enrobés

8. Méthode d'exécution - Lors des travaux de revêtement bitumineux, une déviation a été mise en place pour permettre la fermeture totale de la route au trafic
- Longueur du tronçon réfectionné : 325 m'

